Възложител	**Община Годеч**
Име на проекта	**"Ремонт и преустройство на ОДЗ "Юрий**

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Механизация	Брой работници	Брой работни дни
Част: АС						
	А2: Демонтажни работи:					
1	Опазване с найлон и изнасяне на имущество	бр.	1.00		7	5
2	Демонтаж на теракотни плочи в мокри помещения и складове и тераси	м2	223.28		4	4
3	Демонтаж фаянсова облицовка и основа по стени в санитарни помещения умивалници и мокри помещения.	м2	126.08		6	4
4	Демонтаж на съществуващи интерворни врати	бр.	14.00		2	1
5	Демонтаж на съществуващи външни врати 90/200см	бр.	2.00		2	1
6	Демонтаж и изваждане на нафтова цистерна около 5т. При демонтажа се изпоства противопожарна пяна за предотвратяване на пожар	бр.	1.00		2	1
7	Разбиване на съществуваща рампа от СТБ-конструкция	м3	12.50		10	2
8	Изнасяне на ръка и натоварване на контейнери за строителни отпадъци и оборудване от мокри помещения	м3	72.22		14	5
9	Извозване на строителни отпадъци на депо до 20км. Вкл. такси депо	м3	93.88		3	5
	Б: Стени- облицовки и бояджийски по стени:					
10	Доставка и изграждане на стени от газобетон d=25см.	м2	6.33		3	1
11	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени	м2	126.08		4	2
12	Доставка и монтаж на фаянс по стени - вкл. , лепило, фугираща смес и силикони за уплътняване по ъгли	м2	126.08		5	6
13	Начукване и грундиране на стени - подготовка за шпакловка	м2	399.06		4	3
14	Вътрешни гипсови шпакловки по стени	м2	399.06		4	6
15	Вътрешно обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и врати	лин.м	25.13		2	1
16	Доставка и монтаж на алуминиев ъгълоразделител	лин.м.	25.13		4	1
17	Вътрешна финна шпакловка и шлайфане преди бояджийсване	м2	399.06		6	9
18	Полагане на грунд за стени преди бояджийсване - вътрешно	м2	399.06		5	2
19	Полагане на грунд за тавани преди бояджийсване- вътрешно	м2	135.78		4	1
20	Трикратно бояджийсване на шпакловани стени с цветна водоемулсионна боя (ДАТЕКС)	м2	399.06		3	10
21	Трикратно бояджийсване на шпакловани тавани с бяла водоемулсионна боя	м2	135.78		2	6
22	Поставяне на подпрозоречен первал от врачански варовик от вътрешна страна с ширина до 15см	м	5.75		4	2
	В. Настилки и Замазки					
23	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по подове с дебелина 5см при изкъртени подове	м2	223.28		3	2
24	Доставка и полагане на хидроизолация обмазка на циментова основа - под настилки в мокри помещения	м2	446.56		4	4
25	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес (мокри помещения и кухни), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	м2	223.28		3	8
26	Доставка и монтаж на чела от гранитогрес по тераси и копирки, вкл. фугиране и уплътняване със силикон	лин.м.	196.80		2	4
27	Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес (мокри помещения и кухни), вкл. фугиране и уплътняване със силикон по ъгли	лин.м	200.12		2	4
28	Доставка и полагане на самораслваща замазка 5мм под ПВЦ настилка	м2	253.15		3	1
29	Доставка и полагане на ПВЦ настилка с фигури по арх. Детайл, вкл. лепило	м2	253.15		3	2
30	Доставка и полагане на ПВЦ перваз тип холкер по детайл, вкл. лепило	лин.м	178.94		2	2
31	Доставка и полагане на ПВЦ настилка по стъпби, вкл. чела - размер на стъпало 162x32x15см	бр.	22.00		5	5
32	Доставка и монтаж на алуминиева алтова лайсна по стъпби - дължина на стъпало 162см	бр.	21.00		5	1
	Г.Покривни работи					
33	Демонтаж и монтаж на соларни панели	бр.	8.00		4	3
34	Демонтаж - на съществуваща ламарина и улуци по бордове и стрехи	лин.м	179.44		4	4
35	Демонтаж - на съществуващ покрив от ламарина и керемиди	м2	1 033.70		6	7
36	Доставка и полагане на битумен грунд за хидроизолация	м2	1 033.70		6	2
37	Доставка и полагане на подпокривна хидроизолация на битумна основа 1пласт, 4мм	м2	1 033.70		6	2
38	Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция - ребра H=12см закрепени върху бетонов покрив	м3	24.81		4	7
39	Доставка и монтаж на топлоизолация от мин. Вата d=12см мин. 120кг/м3	м2	826.96		4	6
40	Доставка и монтаж на дървена покривна обшивка с ОСБ плоскости 15мм	м2	1 033.70		6	11
41	Доставка и полагане на подпокривна хидроизолация на битумна основа 1пласт,4мм	м2	1 033.70		6	2
42	Доставка и полагане на летви 3х4см на двойна скара	лин.м	6 202.17		9	9

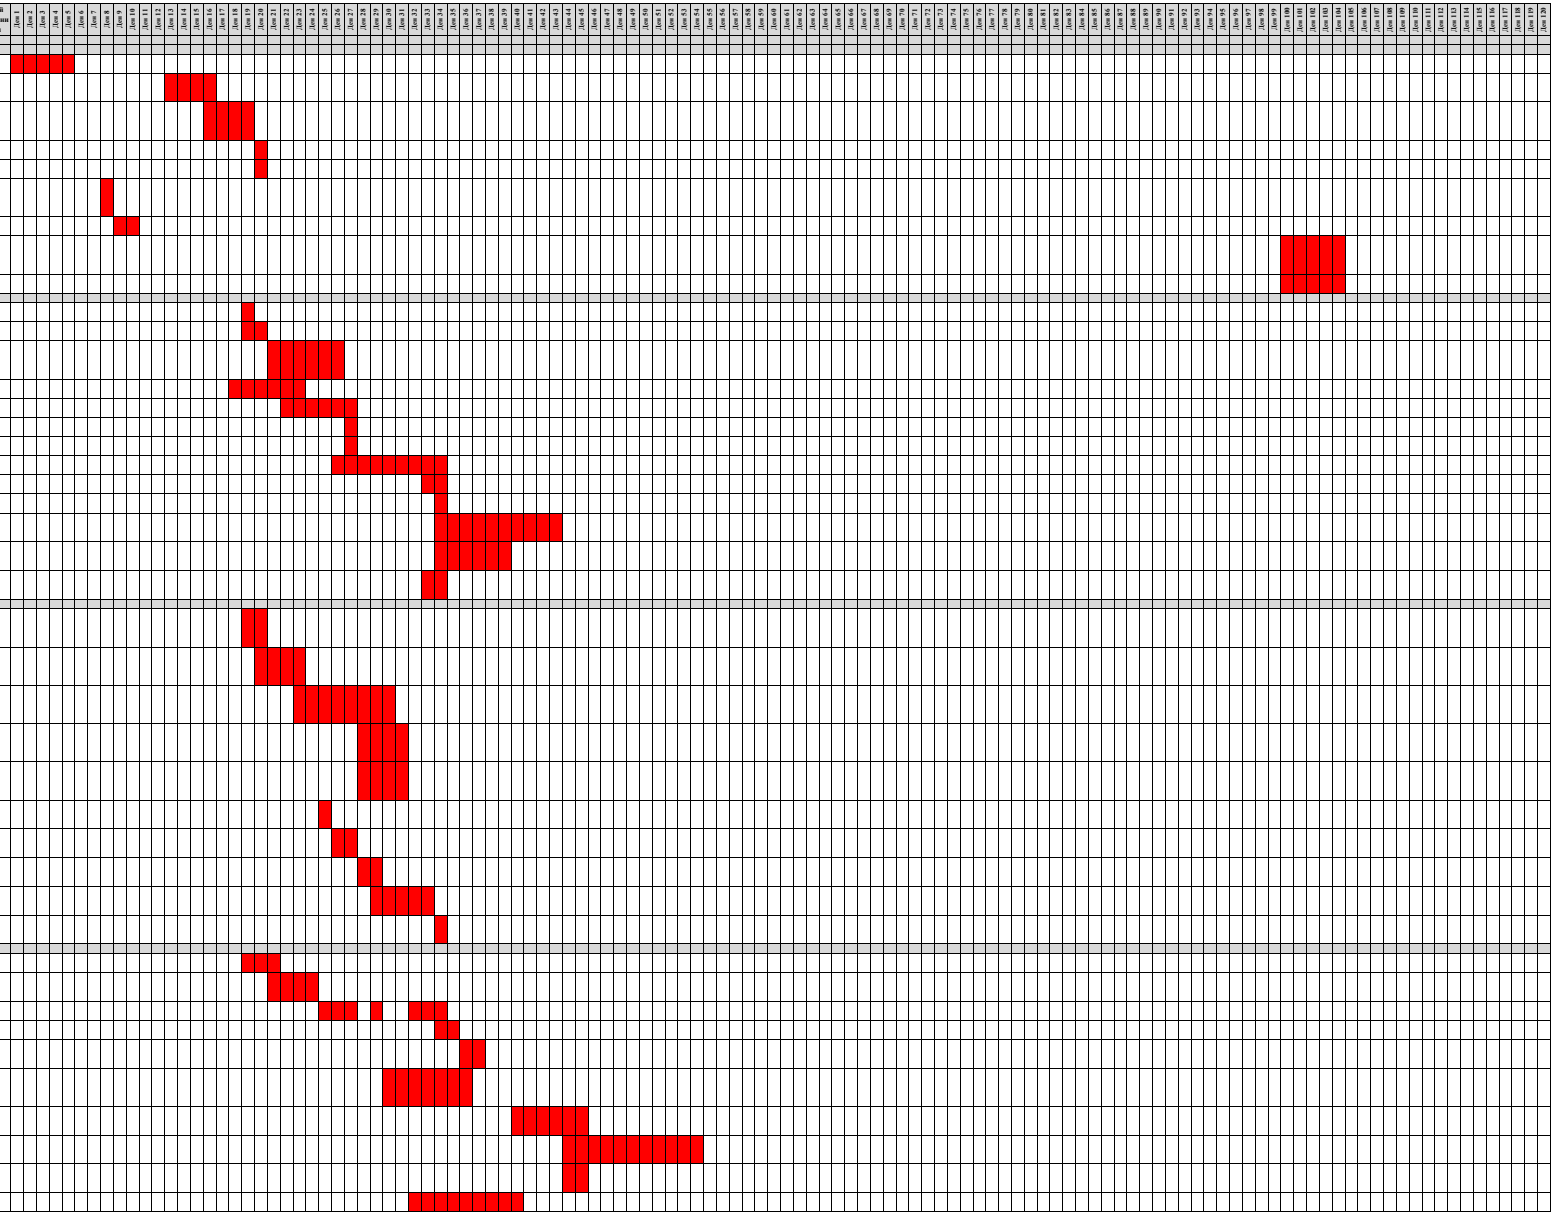

43	Футиране на първи ред детайл с битумен фугопълнител	лин.м	4 134.78	4	3
44	Доставка и монтаж на бетонови керемиди	м2	1 033.70	5	7
45	Доставка и монтаж на хидроизолация листов материал под било	лин.м	62.34	2	2
46	Доставка и монтаж на бетонови капаци	лин.м	62.34	2	2
47	Доставка и полагане на OSB плоскости общити с поцинкована ламарина по бордове и стрехи и оформяне на чела на стрехи 30см	лин.м.	195.24	4	1
48	Монтаж на улуци от поцинкована ламарина ф 100	лин.м.	195.24	4	3
49	Доставка и обшивка с поцинкована ламарина около комини и др.	м2	30.00	3	4
50	Доставка и монтаж на подпъртна пола с под.ламарина 0,55 мм	м2	195.24	2	6
51	Доставка и монтаж на барбакан за тераси	бр.	5.00	2	1
52	Натоварване и извозване на отпадъци от покрив	м3	51.68	2	3
Д. Дограми:					
54	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма по приложена спецификация - 3ламерна, бяла, с двоен стъклопакет нискоенергийно/бяло стъкло с дебелина 6/4мм.	м2	16.65	2	1
55	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви первази с ширина до 15см	м	5.75	2	1
56	Доставка и монтаж на външни врати - метални	бр.	2.00	2	1
57	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати при мокри помещения	бр.	14.00	2	6
Д. Фасадни обработки:					
58	Изчукване на подкожушени мазилки по стени на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	77.68	4	4
59	Демонтаж на топлоизолация по стени на сутерен в английски дворове	м2	108.77	4	8
60	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка по подове на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	174.89	5	9
61	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 10см по дъно на английски двор	м2	174.89	5	1
62	Доставка и полагане на циментова замазка 10см за наклони	м2	174.89	5	1
63	Доставка и полагане на хидроизолационен футопълнител по вътрешни ъгли на английски дворове	лин.м.	111.46	2	3
64	Доставка и обмазване с хидроизолация на циментова основа. Шпакловане по стени и подове на АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ	м2	283.66	4	2
65	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS 10cm с вкл. лепило, мрежа, дюбели и декоративна шпакловка	м2	286.35	2	4
66	Доставка и полагане на декоративна минерална мазилка цвят и зърнометрия по мостра тип мозечна ПО СТЕНИ АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ, вкл. грунд	м2	77.68	4	2
67	Доставка и полагане на декоративна силикатна мазилка цвят и зърнометрия по мостра тип мозечна ПО ФАСАДИ, вкл. грунд	м2	286.35	6	2
68	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой с размери по одобрена мостра от архитекта антрацит положени на суха фуга	м2	174.89	4	10
69	Доставка и полагане на замазка по рампа	м2	20.34	3	1
70	Доставка и монтаж на термолющен гранит 3см настилка на рампа	м2	20.34	3	3
71	Доставка и монтаж на бордове d=15cm, h=5cm. на рампа	лин.м	32.34	4	1
72	Доставка и монтаж на облицовка от изкъствен камък по цокъл рампа	м2	12.19	2	2
73	Доставка и монтаж на парапет за рампа	м2	20.34	2	1
74	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по тераси и площадки H=105см	лин.м.	56.07	4	1
75	Демонтаж, доставка и монтаж на нов парапет по бордове H=30см	лин.м.	44.67	2	1
Част: "ВиК"					
	Направа на водна промивка на съществуваща дворна канализация	м'	177.000	1	1
2	Направа на изкоп в земна почва с шир. до 1,20 м и дълб. до 2,5 м – незукрепен	м3	332.00	3	5
3	Подравняване дъно на изкоп с дълб. 10 см за направа на пясъчна подложка	м3	15.00	3	1
4	Направа на пясъчна подложка с вис. 10 см, вкл. доставка и транспорт	м3	4.00	4	1
5	Направа на пясъчна засипка с вис. 40 см върху положени тръби, вкл. доставка и транспорт	м3	16.00	2	2
6	Доставка и насипване на дренажен материал с едрина на трите от 40 до 63 мм, вкл. транспорт	м3	23.00	4	1
7	Извозване на земни маси с камион вкл. товарене и разтоварване	м3	43.00	6	1
8	Засипване на изкоп и трамбоване на земни маси на пластове от 0,20м до пълтност 1,7т/м3	м3	293.00	6	2
9	Доставка и полагане в готов изкоп на полиетиленови дренажни тръби висока пълтност ф110мм, вкл. транспорт	м'	146.00	4	2
10	Доставка и полагане в готов изкоп на PVC муфени тръби SN4 ф110, вкл. фасонни части	м'	78.00	2	2
11	Доставка и монтаж на дворен сифон с вграден пясъкоуловител.ф100	бр.	3.00	2	1
12	Доставка и монтаж на ревизионна шахта ф110мм	бр.	14.00	2	1

13	Доставка и полагане на геотекстилно платно с тегло 300гр\м2	м2	292.00		4	3
14	Доставка и полагане на влагозащитна мембрана	м2	258.00		4	3
15	Направа на водна промивка на дренаж	м'	146.00		1	1
Част: "Ел"						
I. СМР по ремонт на помещения в ОДЗ						
1	Демонтаж на стари осветителни тела.	бр	210.00		3	9
2	Демонтаж на стари ключове и контакти.	бр	116.00		3	5
3	Демонтаж на кабели/проводници	м	160.00		3	1
4	Демонтаж на метални неизползваеми ел.табла с р-ри до 1х1,5 м	бр	2.00		3	1
5	Доставка и монтаж на плафониера , бяла, кръгла,комплект с Е27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP21.	бр	93.00		6	7
6	Доставка и монтаж на влагозащитена плафониера , бяла, кръгла,комплект с Е27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP44.	бр	25.00		6	4
7	Доставка и монтаж на влагозащитен аплик за фасаден монтаж , комплект с Е27 крушка LED 10W ; 2700K ; IP54.	бр	5.00		6	1
8	Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W; 840 ; EIIPA ; AL ,да арабол . отражател ; 600х600 мм ; за открит монтаж.	бр	12.00		6	2
9	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36W; 840 ; EIIPA; за открит монтаж IP21.	бр	42.00		6	4
10	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18W; 840 ; EIIPA ; за открит монтаж IP21.	бр	10.00		6	2
11	Доставка и монтаж на влагозащитено ЛОТ 2х36W; 840 ; EIIPA ; поликарбонатен разсейвател; за открит монтаж IP65.	бр	23.00		6	3
12	Доставка и монтаж на специализирани осв.тела за физкултурен салон Led 50W ; IP44 с допълнителна защитна удароустойчива метална предпазна решетка.	бр	9.00		6	1
13	Доставка и монтаж на ключ, обикновен, 10А, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	50.00		6	3
14	Доставка и монтаж на ключ, сериен, 10А, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	4.00		6	1
15	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен, 10А, за скрит монтаж, комплект с конзола.	бр	6.00		6	1
16	Доставка и монтаж на ключ, обикновен, 10А, влагозащитен IP44, за открит монтаж.	бр	20.00		6	2
17	Доставка и монтаж на контакт 16А; 230V ; защита от деца ; за скрит монтаж комплект със конзола.	бр	22.00		6	2
18	Доставка и монтаж на влагозащитен контакт 16А; 230V ; IP44 с капаче; за открит монтаж.	бр	9.00		6	1
19	Доставка и монтаж на влагозащитен трифазен контакт 16А; 400V ; IP44 с капаче; за открит монтаж. Комплект със щепсел.	бр	5.00		6	1
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 мм открито по стени на скоби.	м	50.00		4	1
21	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5 мм открито по стени на скоби.	м	50.00		4	1
22	Ремонтни дейности по направа на лампен изход с мостов кабел ПВВ-МБ1 3х1,5 мм2 скрито под мазилка, включвателно направа на улей в мазилка и вълстановяване измазване и боядживане.	бр	10.00		4	1
23	Ремонтни дейности по направа на контактен изход с мостов кабел ПВВ-МБ1 3х2,5 мм2 скрито под мазилка, включвателно направа на улей в мазилка и вълстановяване, с измазване и боядживане.	бр	1.00		4	1
24	Доставка и монтаж на комплект ледотопителна система за всичка улици и водоотоци на сградите, включваща доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на : захранване от ГРТ ; табло с изведи и с контролер за автоматично управление с възможност и за ръчно включване/изключване ; ледотопителен нагревателен кабел с обща дължина ~300 метра ; всички необходими датчици за влага и температура , както и всички необходими допълнителни материали и аксесоари по оферта - инженерингова услуга.	компл.	1.00		2	1
II. Мълниезащитна инсталация.						
1	Демонтаж на съществуващата стара мълниезащитна инсталация от покривите на ОДЗ	бр	1.00		3	1
2	Доставка и монтаж (замонолитване) на мачта 4 метра с ребрени накрайник за монтаж на активен мълниеприемник и странични държачи с изолатори.	бр	1.00		3	1
3	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие с Δt 60 μs.	бр	1.00		3	1
4	Доставка и монтаж на AL-алуминиев проводник AlMgSi 0,5 Φ 8 mm, екструдиран, полутвърд, изолиран със специална неторима изолация 1,5 mm	м	25.00		3	1
5	Доставка и монтаж на стандартни носачи за керамични керемиди.	бр	6.00		3	1
6	Доставка и монтаж на стандартни носачи за външен монтаж по фасадата на сградата.	бр	8.00		3	1
7	Доставка и монтаж на стандартна кет кутия 10х15 см , за вграден монтаж.	бр	1.00		3	1

8	Доставка и монтаж на прав съединител (клема Ф / шина) за контролно измерване на преходното съпротивление. (монтира се в купията по горната точка)	бр	1.00	3	1
9	Доставка и монтаж на поцинкована стоманена шина 40/4 мм	бр	6.00	3	1
10	Направа на стандартен заземител комплект от 3 бр. поц.кола Ф20/1500мм (или L профил 63/63/6 мм) и съединителна шина 40/4 мм. (Rпр<10ома) - заземител към мълниезащитната инсталация на сградата	компл.	1.00	3	1
III. Външно осветление и прожекторна електроинсталация :					
1	Трасиране на кабелна линия.	м	260.00	1	1
2	Направа на кабелен изкоп с размери 0,4 / 0,8 м в почви III-та категория включително зариване, трамбоване на пластове и полагане на стандартна сигнална кабелна лента	м	260.00	4	3
3	Доставка и монтаж на червена гофрирана PVC тръба Ф 50 мм с теглич	м	260.00	4	1
4	Доставка и монтаж на метален парков стълб, с h=4 м ; комплект с отклонителна кабелна кутия вградена в стълба - по детайл.	бр	15.00	3	2
5	Доставка на осл.тяло тип парково , опална сфера ; удароустойчива, с МХЛ 70W ; IP54 и монтаж на същото на парковия стълб.	бр	15.00	3	2
6	Направа на заземление на метален парков стълб с единичен кол 63/63/6 мм с дължина 1,5 м и шина 2м.	бр	15.00	3	2
7	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5 х 4 мм2 в PVC тръба в изкоп.	м			
8	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 в парков стълб.	м	90.00	3	2
9	Доставка и монтаж на апаратура за нови три извода (по схема чертеж № 2) в съществуващото главно ел.табло на ОДЕ.	компл.	1.00	3	1
10	Доставка и монтаж на ел.табло Тсц. "Сцена" - по схема чертеж № 2	бр	1.00	3	1
11	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 4 мм2 до табло Тсц "Сцена"	м	25.00	3	1
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 (от табло в сутерен до учебния светофар на площадката)	м	25.00	3	1
13	Всички необходими ел.измервания по точки I, II и III : (изолация на захранващи кабели ; импеданс Zs "фазa-защитен проводник", преходно съпротивление на заземителите , задействане на ID) и изготвяне на протокола от ел.лаборатория.	компл.	1.00	3	1
ЧАСТ: "ВиК"					
А. Благоустрояване на дворно пространство					
1	Демонтаж на метална част на съществуваща ограда	лин.м	265.36	4	1
2	Демонтаж на метални врати по огради	бр	4.00	4	1
3	Разбиване на съществуваща СТБ-конструкция на ограда	м3	139.31	6	2
4	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка вкл. градински бордюри	м2	542.21	4	5
5	Разбиване на асфалтова настилка	м2	1 074.97	7	12
6	Натоварване на натрошени строителни отпадъци, механизирано	мсм	20.00	4	5
7	Изнозване на стара тротоарна настилка и натрошени строителни отпадъци на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	391.34	8	4
8	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения	бр.	32.00	6	7
9	Изнозване на съществуващи детски съоръжения и складиране на депо	бр.	1.00	1	1
10	Изкоп в земни почви	м3	972.36	8	12
11	Изнозване на земни почви на депо, вкл. такса депо, до 10км	м3	1 361.31	8	12
12	Трошено-каменна подложка ф-63	м3	486.18	5	6
13	Доставка на трошено-каменна подложка ф-63, от 10км	м3	486.18	5	6
14	Пясък	м3	150.00	3	3
15	Доставка на пясък от 10км	м3	150.00	3	3
16	Полагане на трошеномаменна основа механизирано	мсм	10.00	3	2
17	Валиране с 10т валяк на трошеномаменна основа	мсм	20.00	3	2
18	Доставка на земноваляен циментов разтвор	м3	49.92	1	2
19	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета с мит покривен слой с размери по одобрена мостра от архитекта антрацит положени на суха фуга	м2	676.03	6	16
20	Доставка и монтаж на градински бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/16/8см сини положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	554.62	8	7
21	Доставка и монтаж на уличен бордюр от вибропресовани бетонови блокчета с с размери 50/25/16см сини положени върху пясъчно циментов разтвор	лин.м	114.15	5	3
22	Доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи с размери 30/30/6см жълти положени върху на суха фуга	м2	2.88	6	1
23	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолощен гранит при вход стълби на сградата с дължина 150см, 32см ,d=3см	лин.м.	9.00	2	1
24	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолощен гранит към английски двор стълби с дължина 200см 32см d=3см	лин.м.	28.00	2	3
25	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термолощен гранит към английски двор стълби с дължина 320см 32см d=3см	лин.м.	19.20	2	3

26	Доставка и монтаж на стъпала и чела от термополиран гранит към английски двор стъпби с дължина 125см 32см /d=3см	лин.м.	17.50		2	2
27	Доставка и монтаж на площадки от термополиран гранит към стъпби на входове и английски двор с размери 30см 33см /d=2см	м2	30.15		2	4
28	Доставка и монтаж на шапки по бордюре от полиран гранит при входни стъпби и английски дворове 66см d=3см	лин.м.	52.84		4	2
29	Доставка и монтаж на бетонова шапка по ОГРАДА с широчина 48см по одобрена мостра от архитекта	лин.м.	265.36		4	4
30	Доставка и полагане на каменна облицовка след одобрена мостра от архитекта ПО ЦЯЛАТА ОГРАДА, вкл. лепило и всичко необходимо за монтажа	м2	318.43		9	6
31	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ ПАНА ЗА ОГРАДА по спец.	лин.м	265.36		4	4
32	Доставка и полагане на МЕТАЛНИ КОЛОНКИ ЗА ОГРАДА по спец.	бр.	120.00		4	6
33	Доставка и монтаж на метални решетъчни врата по спец. двор	бр.	1.00		2	1
34	Доставка и монтаж на метални решетъчни врата по спец. двор	бр.	1.00		2	1
35	Доставка и монтаж на метални решетъчни врата по спец. двор	бр.	1.00		2	1
36	Доставка и полагане на хидроизолационна, каучукова настилка	м2	374.66		4	10
37	Доставка и полагане на изкуствена трева за игрище	м2	204.50		2	4
38	Доставка и полагане на първи битумен разлив	м2	300.50		2	5
39	Бандер с асфалтобетон за изравнителен пласт	т	36.06		3	4
40	Втори битумен разлив	м2	300.50		4	4
41	Доставка и полагане на пластен асфалтобетон 4см	м2	300.50		6	4
42	Доставка на обогатена с хумус почва	м3	200.30		3	5
43	Разнасяне на почва	мсм	10.00		2	2
44	Затревяване	м2	2 002.99		5	3
	Пресстройство рампа:					
45	Изкопи	m3	10.00		3	1
46	Кофраж	m2	250.00		6	2
47	Бетон В25(С20/25 S3)	m3	40.00		2	1
48	Армировка - Стомана АIII (N) - (S500)	kg	2 400.00		5	2
49	Готови сандвич панели	m2	16.00		4	3
50	Химически анкерирани армировъчни пръти	бр.	230.00		4	4
51	Разбиване на бетон (съществуваща конструкция)	m3	5.00		3	1
	Външни Площадки:					
52	Изкопи	m3	350.00		3	5
53	Трамбована баластра	m3	210.00		3	2
54	PVC фолио	m2	750.00		2	2
55	Бетон - С30/37 S3 (XC4)	m3	140.00		2	1
56	Армировка - Двойни заварени мрежи N8/20 - (S500)	kg	6 900.00		5	3
57	Фуги	m'	60.00		4	1
	Ограда:					
58	Изкопи	m3	120.00		3	3
59	Кофраж	m2	500.00		6	5
60	Подложен Бетон В10(С8/10)	m3	10.00		3	1
61	Бетон В25(С20/25 S3)	m3	150.00		3	1
62	Армировка - Стомана АIII (N) - (S500)	kg	5 760.00		5	2
63	**Парковустройство и благоустройство**					
64	Засаждане на широколистни видове в дупка с размер 80/80/80см	бр.	11.00		3	2
65	Внасяне на оборска тор в дъното на дупката - 10кг/бр. Фиданка	кг.	1 100.00		6	2
66	Поставяне на укрепителни колове по 2бр. на фиданка	бр.	22.00		4	2
67	Засаждане на храсти	бр.	1 103.00		10	7
68	Внасяне на оборска тор 1кг/бр. храст	кг.	1 103.00		2	7
69	Изграждане на тревни площи	м2	1 986.00		6	10
70	Внасяне на приблизително 20см. Разбухкатпочвен слой	м3	400.00		6	4
71	Засяване на тревно семе приблизително по 25гр/м2	кг.	50.00		2	1
72	Внасяне на амониева селитра приблизително по 20гр/м2	кг.	40.00		2	1
53	Външно фасадно скеле - доставка, монтаж и демонтаж	м2	1 440.00			

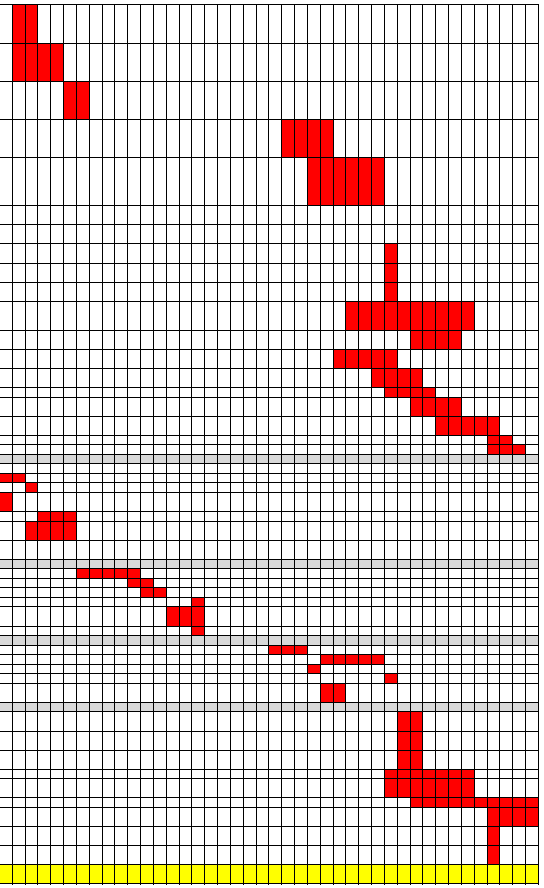

.....

подпис и печат

дата:.....
